

SINERGIA

Associazione di volontariato e solidarietà con il mondo

Vi scriviamo da Lima, in Perú, per condividere con Voi i progressi del progetto di rifacimento del tetto a cui gli amici del gruppo CAI Cesare Battisti di Verona hanno generosamente voluto destinare i fondi della campagna NATALE ALPINO 2010.

I lavori sono iniziati lunedì 07 marzo 2011, che qui coincide con la fine dell'estate. La nostra preoccupazione era infatti di riuscire a terminare i lavori prima degli inizi dell'inverno, che qui é piú mite che in Italia, ma comunque risulta piuttosto umido e i ragazzi non starebbero a loro agio negli ambienti prefabbricati di cartongesso e lamiera in cui si sono momentaneamente sistemati.



Bagni prefabbricati



Cucina prefabbricata



Ambienti prefabbricati

Il sabato precedente con l'aiuto dei ragazzi avevamo svuotato la casa di tutti i mobili e oggetti e li avevamo trasferiti negli ambienti provvisori, allestiti grazie anche al generoso aiuto di un volontario italiano di San Michele Extra che é stato qui nel mese di gennaio.

I muratori hanno proceduto innanzitutto alla demolizione della precedente copertura, un multistrato leggero di canne e pali di bambú, teloni di plastica e strato sottile di cemento. Tale operazione é durata un'intera settimana.




Associazione SINERGIA - Via Rovereto 24- 37126 Verona
Numero Registro Regionale Associazioni di Volontariato VR0684

Tel. + 39 3394984080 - Fax elettronico +39 02/700520202 - C.F. 90013480232
www.sinergias.eu e-mail: segreteria@sinergias.eu

SINERGIA

Associazione di volontariato e solidarietà con il mondo

Successivamente l'impresa edile ha proceduto a scavare le fondamenta delle colonne portanti interne ed esterne, ad armare lo scheletro di ferro delle stesse, le intelaiature di legno e infine alla gettata di cemento. Lo scavo delle fondamenta é stato particolarmente faticoso e ha ritardato di circa una settimana i lavori, perché é sorto un imprevisto dovuto all'infiltrazione d'acqua della falda e delle fognature. Il nostro terreno é infatti situato a poche centinaia di metri del fiume e la falda acquifera che alimenta il nostro pozzo passa a pochi metri sotto la superficie, distanza che arriva ad un solo metro nel periodo estivo. L'innalzamento della falda riduce di molto il volume libero della fossa biologica, provocando lo straripamento occasionale delle acque scure e in questo caso le infiltrazioni negli scavi. Con vari accorgimenti si é comunque riusciti a portare a termine gli scavi e la costruzione delle colonne.

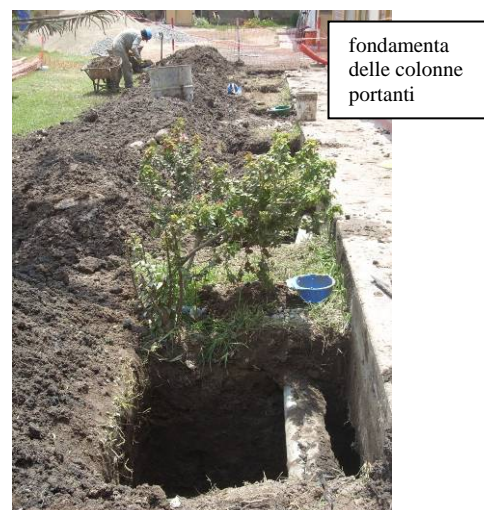

Gli operai hanno poi innalzato l'intelaiatura di legno destinata a sostenere le armature di ferro, i mattoni e la gettata di cemento della soletta. Nella preparazione della soletta si sono predisposti sia i collegamenti elettrici che idraulici per il futuro secondo piano, di cui abbiamo già fatto fare il progetto.



Sabato 09 aprile é stato il momento piú importante ed emozionante dei lavori: la gettata della soletta. Sono arrivate quattro betumiere da 4 metri cubici ciascuna e il macchinario destinato a pompare il cemento sul tetto. Muniti di vibratore per favorire la distribuzione e la penetrazione del cemento armato in tutti i punti della soletta, una squadra di circa una ventina di muratori ha portato a termine la gettata .

Associazione SINERGIA - Via Rovereto 24- 37126 Verona
Numero Registro Regionale Associazioni di Volontariato VR0684

Tel.+ 39 3394984080 - Fax elettronico +39 02/700520202 - C.F. 90013480232
www.sinergias.eu e-mail: segreteria@sinergias.eu

SINERGIA

Associazione di volontariato e solidarietà con il mondo



Anche noi eravamo così emozionati che non abbiamo resistito a salire sul tetto per vedere da vicino i lavori. È stato un evento anche per il piccolo paesino dove viviamo perché non è così frequente che per le strette stradine sterrate transitino tante betoniere.

Per circa 10 giorni i lavori si sono interrotti per permettere al cemento di asciugarsi e da lunedì 18 aprile sono iniziate le operazioni di smantellamento delle intelaiature in legno. Successivamente si procederà alle malte per il rivestimento del soffitto e delle colonne, per culminare con il rifacimento dei pavimenti. Il tutto dovrebbe terminare, salvo imprevisti, verso la metà di maggio. A quel punto l'impresa edile avrà terminato i suoi compiti e dovremmo procedere autonomamente alla messa a punto degli impianti elettrici e alla ritinteggiatura interna di tutta la casa. Speriamo vivamente di competere il tutto a fine maggio, giusto in tempo per trasferire i ragazzi prima dell'arrivo del freddo.



Vi ringraziamo di cuore per l'aiuto che state dando alla nostra casa-famiglia perché i ragazzi possano vivere in una casa più dignitosa e isolata dall'umidità. Il Vostro contributo è davvero prezioso.

*Un caloroso abbraccio,
Alessandra Donatelli, Martin Milla, ragazzi e operatori tutti.*

Associazione SINERGIA - Via Rovereto 24- 37126 Verona
Numero Registro Regionale Associazioni di Volontariato VR0684

Tel. + 39 3394984080 - Fax elettronico +39 02/700520202 - C.F. 90013480232
www.sinergias.eu e-mail: segreteria@sinergias.eu
